

На основу података из дате табеле урадити:

1. мрежни план

2. гантограм за следеће податке:

а) предвиђено је да се са радовима почне 04.05.2009.


б) нерадни дани су неделје и празници

ц) услед неповољних климатских услова немогуће је радити 6 дана


3. дијаграм радне снаге и његову изгачану варијанту

aktivnosti	t_i	NA	UA	br. radnika
1	2	2,3	/	3
2	3	4,5	3	4
3	4	5	2	6
4	5	6,7	5	5
5	3	6,9	4	7
6	4	7,8	/	5
7	2	10	8,9	8
8	1	11	7,9	3
9	6	14	7,8	2
10	5	12,13	11	10
11	4	12	10	4
12	4	14	/	8
13	6	15	14	9
14	2	15	13	6
15	1	/	/	3

DIJAGRAM RADNE SNAGE

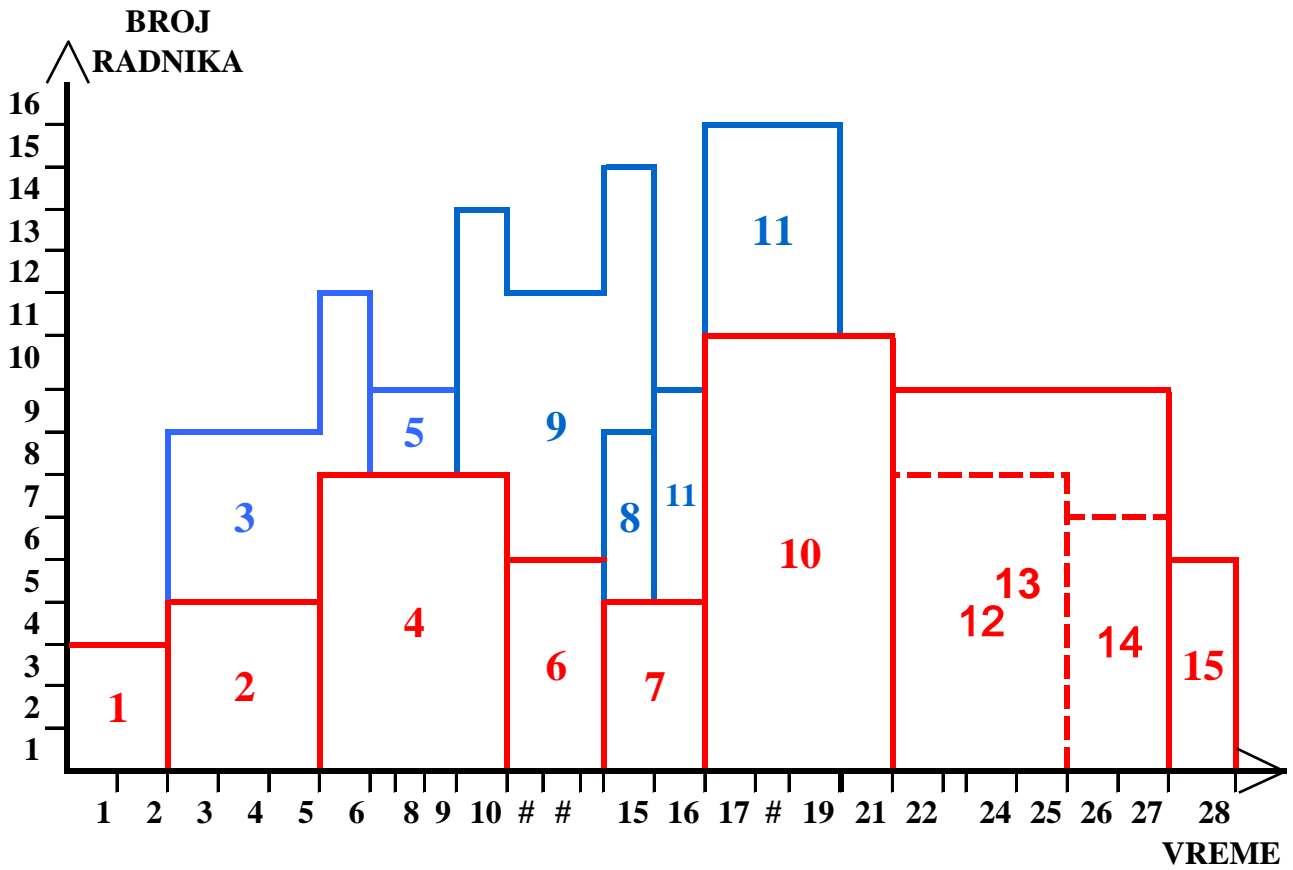

DIJAGRAM RADNE SNAGE GLAČANA VARIJAN

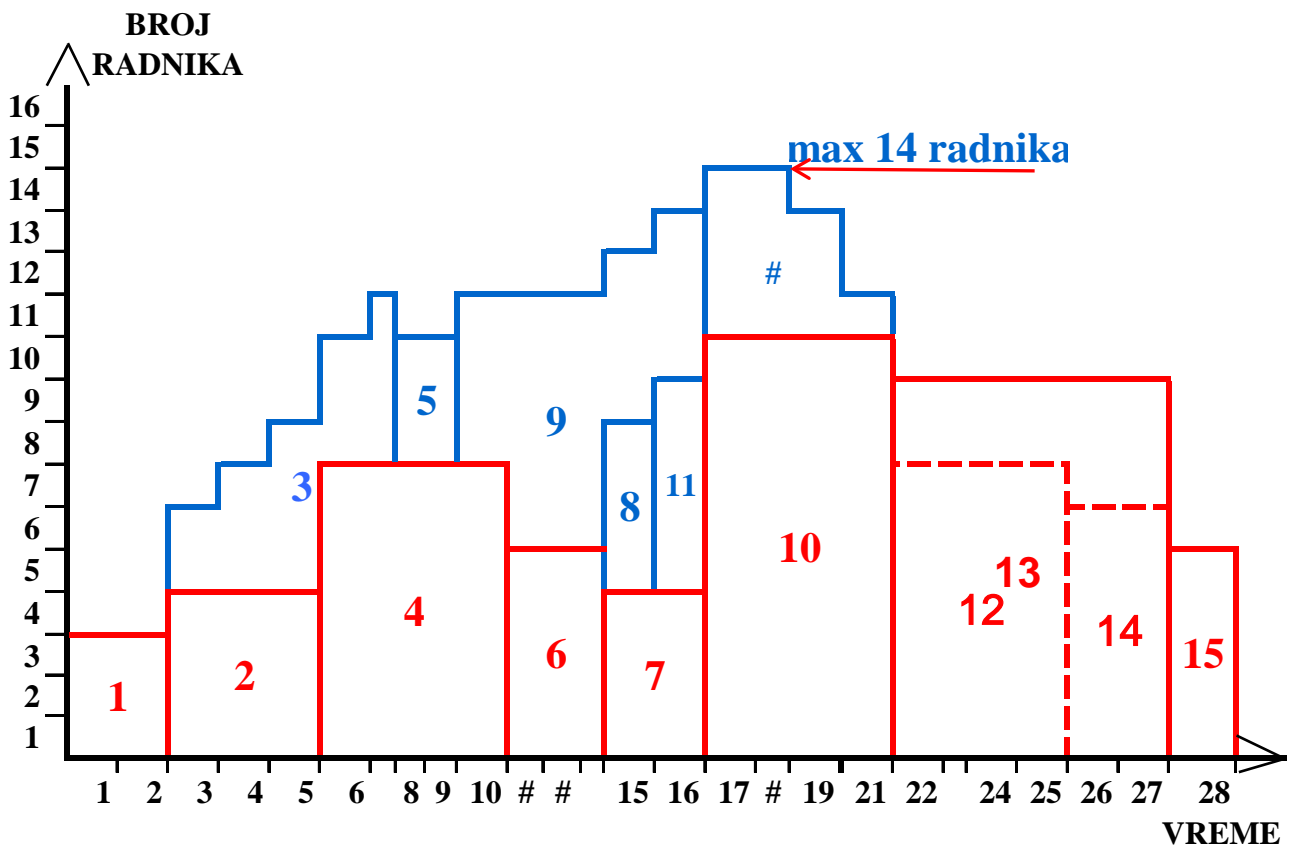

AKTIV.	t_i	RZ	KZ	RP	KP	TU	TS
1	2	2	2	0	0	0	0
2	3	5	5	2	2	0	0
3	4	6	7	2	3	1	0
4	5	10	10	5	5	0	0
5	3	9	10	6	7	1	0
6	4	14	14	10	10	0	0
7	2	16	16	14	14	0	0
8	1	15	17	14	16	2	0
9	6	15	25	9	19	10	10
10	5	21	21	16	16	0	0
11	4	19	21	15	17	2	2
12	4	25	25	21	21	0	0
13	6	27	27	21	21	0	0
14	2	27	27	25	25	0	0
15	1	28	28	27	27	0	0
